

呼图壁县 2023 年公路 生命安全防护工程 绩效评价报告

项目名称：呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程

实施单位：呼图壁县交通运输局

委托单位：呼图壁县财政局

评价机构：新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所





摘 要

一、项目概述

（一）项目背景及目的

“十四五”时期处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，迈入高质量发展新阶段，人、车、路等道路交通要素仍将持续快速增长。预计到2025年，我国机动车保有量、驾驶人数量、公路通车里程将超过4.6亿辆、5.5亿人和550万公里。同时，交通要素增长重心由大城市向中小城市、城镇转移，乡村振兴、城乡一体化带来的农村交通出行变化，老龄化社会引发的老年人安全出行问题，车路协同、自动驾驶、共享出行等新技术新业态的快速涌现带来的交通流量、出行方式变化，人民群众对美好交通出行的向往和追求等，都对道路交通安全工作提出更高要求。

我国制度优势显著，经济长期向好，社会大局稳定，道路交通安全多部门协同共治的格局基本形成，人民群众的交通安全意识正在逐步提升，新技术新发展不断赋能交通管理领域，为道路交通安全治理工作提供了多方面优势和条件。但必须清醒认识到，我国道路交通安全整体形势依然不容乐观，道路交通安全工作基础仍然比较薄弱，存在不少短板弱项，地区和领域发展不平衡不充分问题仍然突出，农村交通安全问题凸显。公众交通安全意识有待进一步提升，交通违法行为仍较为普遍，货车和低速电动车等违法违规生产改装问题依然存在，道路通行条件总体不平衡，交通安全设施设置水平有待提升，道路交通相关行业企业安全主体责任落实不到位问题依然突出，企业重效益轻安全问题长期存在。涉及交通安全的一



些深层次、根源性问题尚未化解，道路交通安全法律法规体系有待进一步完善，新变化、新业态带来的新风险不断涌现，传统问题和新型矛盾交织叠加，道路交通安全工作面临诸多新形势、新任务、新挑战。总体来说，“十四五”期间我国道路交通安全工作仍将处于爬坡过坎、突破瓶颈的关键时期。

呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程主要针对 G312 国道沿线缺少红绿灯和安全标志标牌的现状进行提升改造。G312 线是呼图壁县地理交通的核心地带，车流量较大，过境车辆较多，车辆违法超速情况严重，存在一定的交通安全事故隐患，发生过重特大交通事故案件。为全面治理 G312 线交通安全隐患，降低交通安全事故，呼图壁县交通运输局计划实施呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程，项目的实施对解决居民出行困难，改善群众生产生活条件，消除安全隐患，促进当地社会经济发展起到至关重要的作用。

（二）项目实施情况

2023 年 6 月 15 日，呼图壁县交通运输局取得了呼图壁县发展和改革委员会《关于对〈呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程初步设计〉的批复》（呼发改投资[2023]73 号），项目启动后，呼图壁县交通运输局开始部署开展项目前期工作，落实项目建设资金。2023 年 8 月，通过招投标，确定新疆昌吉市政建设（集团）有限公司及中北工程设计咨询有限公司组成的联合体为项目总承包单位。

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已完成 41 处闯红灯违法监测系统的安装工程。

（三）绩效目标



1. 总目标

提升改造 G312 国道沿线 14 处现状不合理道路交叉口，移树挖根 120 棵；在 16 处道路交叉口安装信号灯、电子警察、标志标牌，新建太阳能黄闪信号灯 12 处，安装闯红灯违法监测系统 41 处，新建机动车信号灯 39 处，新建标志标牌 32 处，新建波形梁护栏 1688m，新建防眩板 5441.1m²。

2. 年度绩效目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

总体目标		年度目标		
提升改造 G312 国道沿线 14 处现状不合理道路交叉口，移树挖根 120 棵；在 16 处道路交叉口安装信号灯、电子警察、标志标牌，新建太阳能黄闪信号灯 12 处，安装闯红灯违法监测系统 41 处，新建机动车信号灯 39 处，新建标志标牌 32 处，新建波形梁护栏 1688m，新建防眩板 5441.1m ² 。		安装闯红灯违法监测系统 41 处。		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	说明
产出指标	数量指标	安装闯红灯违法监测系统数量	≥41 处	安装闯红灯违法监测系统 41 处以上
	质量指标	工程验收合格率	=100%	该项目工程验收合格率达到 100%
		资金支付合规率	=100%	该项目资金支付合规率达到 100%

电话：0994-2340071 传真：0994-2347950

地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 108 号红山新世纪 22 楼 E—mail：hccpa-cj@xj.cninfo.net



	时效指标	资金支付及时率	=100%	该项目资金支付及时率达到100%
	成本指标	项目成本控制率	=100%	该项目成本控制率达到100%
效益指标	社会效益指标	减少道路交通安全隐患	有效减少	项目实施后是否能够有效减少道路交通安全隐患
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度达到95%以上

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对呼图壁县2023年公路生命安全防护工程进行了独立客观的评价，最终评分结果为95分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

呼图壁县2023年公路生命安全防护工程资金预算金额200万元，截止2023年12月31日，实际支出200万元，预算执行率100%，全部用于支付安装闯红灯违法监测系统相关费用。

（三）项目绩效情况

该项目于2023年1月开始实施，截止2023年12月31日，已完成41处闯红灯违法监测系统的安装工程。项目的实施，能够对解决居民出行困难，改善群众生产生活条件，消除安全隐患，促进当地社会经济发展起到至关重要的作用。

三、问题和建议



（一）存在的问题

1. 部分项目绩效指标设置不清晰。

该项目实施单位前期已根据项目内容设置了较明确的绩效目标，绩效目标的设置符合量化的要求，但仍有少部分指标偏定性或难以衡量，有待进一步量化，例如：原可持续影响指标为“项目持续发挥作用期限”，预期指标值为“长期有效”，指标设置不明确，本年度难以衡量指标值是否达成。

2. 项目管理制度不健全。

该项目实施单位沿用本单位的各项内控制度，具有相应的财务和项目管理制度，各项管理制度合法、合规、完整，但未依据本项目的功能特性就规范该项目管理制定专门的内控管理措施。

3. 未执行项目绩效监控工作。

呼图壁县交通运输局未按要求在项目执行过程中开展绩效运行监控管理工作。

（二）建议和改进措施

1. 根据工作计划和工作内容，进一步完善绩效目标和指标。

绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，应与其项目的实施计划相一致，建议项目实施单位在今后细化绩效目标的过程中，应根据项目的实施内容设置项目的产出目标和效果目标，使目标值与年度任务数或计划数相对应。同时根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰、量化、可衡量。



2. 进一步建立健全预算绩效业务管理制度，强化资金过程监督和现场核查。

建议项目实施单位建立健全预算绩效管理制度，完善项目的跟踪管理机制，进一步强化资金过程监督，在自治区绩效监控、绩效自评的时间节点开展数据采集、核对、校验和复核工作，确保上报数据准确，同时要对项目资金执行情况进行定期的现场核查。通过定期检查，及时掌握资金执行金额、实施效果，为预算调整、管理优化、政策调整等提供决策依据。

3. 加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。

建议项目实施单位将绩效管理培训与业务培训相融合，不断提高职工的预算约束及资金使用效益意识，强化各业务流程贯彻绩效管理的执行力，全面优化绩效管理环境，从而确保单位绩效管理水平能够得到充分的提高。

4. 强化绩效目标管理，提升绩效管理水平。

通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标应当充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。建议项目实施单位在设置绩效指标时可根据相关政策文件要求，设置的指标需指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。



目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
1. 项目立项的背景及目的	- 1 -
2. 项目实施主体	- 3 -
3. 项目主要内容	- 4 -
4. 项目实施情况	- 4 -
(二) 项目资金情况	- 5 -
1. 预算情况	- 5 -
2. 预算执行情况	- 5 -
(三) 项目绩效目标情况	- 5 -
二、绩效评价组织情况	- 6 -
(一) 绩效评价目的	- 6 -
(二) 绩效评价原则	- 7 -
(三) 绩效评价依据	- 8 -
(四) 绩效评价工作程序及方法	- 9 -
(五) 绩效评价指标体系及标准	- 13 -
三、绩效评价综合情况及结论	- 14 -
(一) 绩效评价综合结论	- 14 -
(二) 绩效目标实现情况	- 14 -
四、绩效评价情况分析	- 15 -
(一) 项目决策情况	- 15 -
1. 项目立项	- 16 -
2. 绩效目标	- 17 -



3. 资金投入	- 17 -
(二) 项目管理情况	- 18 -
1. 资金管理	- 18 -
2. 组织实施	- 19 -
(三) 项目产出情况	- 20 -
1. 产出数量	- 21 -
2. 产出质量	- 21 -
3. 产出时效	- 21 -
4. 产出成本	- 21 -
(四) 项目效益情况	- 22 -
1. 社会效益	- 22 -
2. 服务对象满意度	- 23 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 23 -
(一) 主要经验及做法	- 23 -
(二) 存在的问题	- 24 -
六、有关建议	- 24 -
七、其他需说明的问题	- 26 -
(一) 关于评价责任的说明	- 26 -
(二) 本次绩效评价的局限性	- 26 -



呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预[2018]158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预[2018]189号）系列文件的要求，受呼图壁县财政局的委托，新疆宏昌天圆有限责任公司以第三方社会评价机构的身份，承担了呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项的背景及目的

“十四五”时期处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，迈入高质量发展新阶段，人、车、路等道路交通要素仍将持续快速增长。预计到2025年，我国机动车保有量、驾驶人数量、公路通车里程将超过4.6亿辆、5.5亿人和550万公里。同时，交通要素增长重



心由大城市向中小城市、城镇转移，乡村振兴、城乡一体化带来的农村交通出行变化，老龄化社会引发的老年人安全出行问题，车路协同、自动驾驶、共享出行等新技术新业态的快速涌现带来的交通流量、出行方式变化，人民群众对美好交通出行的向往和追求等，都对道路交通安全工作提出更高要求。

我国制度优势显著，经济长期向好，社会大局稳定，道路交通安全多部门协同共治的格局基本形成，人民群众的交通安全意识正在逐步提升，新技术新发展不断赋能交通管理领域，为道路交通安全治理工作提供了多方面优势和条件。但必须清醒认识到，我国道路交通安全整体形势依然不容乐观，道路交通安全工作基础仍然比较薄弱，存在不少短板弱项，地区和领域发展不平衡不充分问题仍然突出，农村交通安全问题凸显。公众交通安全意识有待进一步提升，交通违法行为仍较为普遍，货车和低速电动车等违法违规生产改装问题依然存在，道路通行条件总体不平衡，交通安全设施设置水平有待提升，道路交通相关行业企业安全主体责任落实不到位问题依然突出，企业重效益轻安全问题长期存在。涉及交通安全的一些深层次、根源性问题尚未化解，道路交通安全法律法规体系有待进一步完善，新变化、新业态带来的新风险不断涌现，传统问题和新型矛盾交织叠加，道路交通安全工作面临诸多新形势、新任务、新挑战。总体来说，“十四五”期间我国道路交通安全工作仍将处于爬坡过坎、突破瓶颈的关键时期。

呼图壁县2023年公路生命安全防护工程主要针对G312国道沿线缺少红绿灯和安全标志标牌的现状进行提升改造。G312线是呼图壁县地理交通的核心地带，车流量较大，过境车辆较多，车辆违法超速情况严重，存在一定的交通安全事故隐患，发生过重特大交通事



故案件。为全面治理G312线交通安全隐患，降低交通安全事故，呼图壁县交通运输局计划实施呼图壁县2023年公路生命安全防护工程，项目的实施对解决居民出行困难，改善群众生产生活条件，消除安全隐患，促进当地社会经济发展起到至关重要的作用。

2. 项目实施主体

该项目实施主体为呼图壁县交通运输局。主要职责为：保证党的路线、方针、政策和区、州、县党委、人民政府的有关指示、决定在全县交通运输系统的贯彻落实，加强对交通运输工作的领导，对全县交通运输工作中存在的重大问题进行调查研究；负责提出并落实交通运输系统党的建设规划，指导交通运输系统党组织的思想、组织、作风、制度建设以及党员队伍教育管理工作，负责抓好交通运输系统行政、企事业单位的精神文明建设和思想政治工作；贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；主管全县公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制呼图壁县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订呼图壁县运输物流业发展战略与规划；负责辖区内公路交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作；指导全县交通运输行业体制改革；负责组织领导呼图壁县道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全县交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展；负责全县农村公路的养护管理工作；负责编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，监督检查养护计划执行情况和养护质量，指导



监督农村公路管理养护工作；依法制定突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施；负责全县农村公路的安全保护工作；加强全县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权；贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业职业教育和培训工作；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通行业财务、审计、统计工作；协同和会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策；负责全县交通运输行业的提案处理及法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；负责全县交通战备工作；承办呼图壁县人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。

3. 项目主要内容

该项目的主要内容为：提升改造 G312 国道沿线 14 处现状不合理道路交叉口，移树挖根 120 棵；在 16 处道路交叉口安装信号灯、电子警察、标志标牌，新建太阳能黄闪信号灯 12 处，安装闯红灯违法监测系统 41 处，新建机动车信号灯 39 处，新建标志标牌 32 处，新建波形梁护栏 1688m，新建防眩板 5441.1m²。本年计划投资 200 万元，完成 41 处闯红灯违法监测系统的安装工程。

4. 项目实施情况

2023 年 6 月 15 日，呼图壁县交通运输局取得了呼图壁县发展和改革委员会《关于对〈呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程初步设计〉的批复》（呼发改投资[2023]73 号），项目启动后，呼图壁县交通运输局开始部署开展项目前期工作，落实项目建设资金。2023 年 8 月，通过招投标，确定新疆昌吉市政建设（集团）有限公司及中北工程设计咨询有限公司组成的联合体为项目总承包单位。



截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已完成 41 处闯红灯违法监测系统的安装工程。

（二）项目资金情况

1. 预算情况

呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程资金预算金额 200 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，实际到位资金 200 万元，资金到位率为 100%。

2. 预算执行情况

该项目 2023 年实际支出资金总额 200 万元，预算资金执行率为 100%。详细资金支出明细见“附件 2：呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程资金支付明细表”。

（三）项目绩效目标情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

表1 绩效目标表

总体目标	年度目标
------	------



提升改造 G312 国道沿线 14 处现状不合理道路交叉口，移树挖根 120 棵；在 16 处道路交叉口安装信号灯、电子警察、标志标牌，新建太阳能黄闪信号灯 12 处，安装闯红灯违法监测系统 41 处，新建机动车信号灯 39 处，新建标志标牌 32 处，新建波形梁护栏 1688m，新建防眩板 5441.1m²。

安装闯红灯违法监测系统 41 处。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	说明
产出指标	数量指标	安装闯红灯违法监测系统数量	≥41 处	安装闯红灯违法监测系统 41 处以上
	质量指标	工程验收合格率	=100%	该项目工程验收合格率达到 100%
		资金支付合规率	=100%	该项目资金支付合规率达到 100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%	该项目资金支付及时率达到 100%
	成本指标	项目成本控制率	=100%	该项目成本控制率达到 100%
效益指标	社会效益指标	减少道路交通安全隐患	有效减少	项目实施后是否能够有效减少道路交通安全隐患
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度达到 95%以上

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程从决策、管理和绩效三个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论。



通过开展绩效评价，了解呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程目标设定情况、资金分配、使用及管理情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等、资金使用效果和绩效目标完成情况，项目实施后的经济效益、社会效益和可持续性影响等情况，收集整理客观真实的基础数据，为呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程管理提供决策依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取相应措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政性资金使用效益。

（二）绩效评价原则

1. 科学公正、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2. 经济性、效率性、效益性、公平性原则。

把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性、公平性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行业绩、效果优劣。

3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。



（三）绩效评价依据

1. 财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预[2018]167号）；
2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）；
3. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）；
4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30号）；
5. 关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预[2018]158号）；
6. 关于印发《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》的通知（新财预[2018]148号）；
7. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预[2018]189号）；
8. 关于印发《自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（新财预[2018]192号）；
9. 呼图壁县交通运输局提交的绩效自评报告及自评表；
10. 呼图壁县交通运输局提交的项目申请、立项批复、招投标、合同、发票、财政资金支付凭证、验收及内控制度等项目基础资料；
11. 适用于该项目的其他法律法规及规章制度。



(四) 绩效评价工作程序及方法

1. 绩效评价工作程序

(1) 前期准备阶段，包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

(2) 成立评价工作组。

(3) 开展前期调研。评价人员首先从网络等公开方式对项目基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查。在对项目了解的基础上与预算单位主管项目人员及绩效评价指导专家沟通和座谈。最终对初期网络等途径调查的资料进行修正。为编制评价方案奠定基础。

(4) 明确项目绩效目标。评价人员根据项目立项、绩效考评办法等相关资料以及经与预算单位主管项目人员充分沟通，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的绩效目标。

(5) 设计绩效评价指标体系。评价人员经与呼图壁县财政局和预算单位主管项目人员充分沟通，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(6) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据专项资金相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。



(7) 确定指标权重。评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，合理设置各指标权重。

(8) 确定评价范围。根据项目承担单位提供的项目相关资料，进行分类、整理、分析，结合对各种公开数据的汇总、分析，就获取的所有文件资料提出评价意见。

(9) 设计资料清单。根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目承担单位需提交的资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目承担单位配合的事项等。

(10) 制定评价实施方案。我们将项目基本情况、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，经与预算单位、呼图壁县财政局相关科室以及绩效评价专家充分交流、共同研究，制定包含项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

(11) 评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与行业专家首先对评价方案初稿进行论证，然后与预算单位项目主管人员沟通，根据项目承担单位的实际情况，对评价方案、指标体系、资料清单进行多次调整，征求绩效监督指导专家的意见，根据专家意见修改完善后，征求项目主管部门意见，根据反馈意见再次修改完善，报委托方审核同意后实施。

2、组织实施：包括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。



(1) 下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目预算单位提供的资料等，通过业务主管部门通知项目预算单位。

(2) 资料收集与核查。评价人员对项目预算单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开数据资料与项目预算单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(3) 非现场评价。对各项目预算单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并收取问卷调查。通过对被调查对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量适中，基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

(4) 现场评价。组成现场评价工作组对项目进行现场核查评价，主要包括。

①听取情况介绍。听取项目预算单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。

②实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

③资料核查。根据项目预算单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果通过查阅相关资料等手段，对项目预算单位数据进行检查。采



集评价数据、资料以及证明材料经被评价单位加盖公章后，记入评价工作底稿。

④分析评价。以项目预算单位现场收集资料形成的证明材料、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目预算单位的项目决策、管理和绩效等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在问题，进行相关原因分析。

(5) 形成绩效评价结果。对评价情况进行梳理、汇总的基础上形成项目绩效评价结果。评价小组重点的项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价。同时，对其自主申报材料进行了认真的复核和分析。对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解和掌握项目实施进度，了解申报资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

3、综合分析及评价报告撰写：包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

(1) 撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告。全面阐述评价项目的基本情况，明确项目绩效目标，在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目决策、管理、绩效等做出具体分析和评价，对项目绩效与存在问题的分析，力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性。



(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后，评价小组与预算单位进行沟通，征询其意见，此并非预算单位干涉工作组的职业判断，而是从预算单位获取可能的解释和补充资料。综合反馈信息后起草绩效评价报告初稿，上报委托单位。

(3) 提交报告。根据各方提出的合理意见，对评价报告进行修改完善。在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿，含摘要，提交委托方。

4. 评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在实际项目结合经验的情况下，评价小组采取的方法包括但不限于：比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：

在指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比指标预期指标值和指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节：主要采用问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

(五) 绩效评价指标体系及标准

通过对该项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部、自治区财政厅以及呼图壁县财政局相关绩效管理规范性文件当中的



评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

通过对呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程进行绩效评价，该项目最终评价得分为 95 分，评价等级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

表 2 项目评价指标得分情况汇总表

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	15	14	93.33%
项目管理	25	21	84.00%
项目产出	30	30	100%
项目效益	30	30	100%
合计	100	95	95.00%

（二）绩效目标实现情况



通过对重新梳理后设置的绩效目标、指标及预期指标值进行评价打分。呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程的绩效目标与绩效指标实际完成情况列表如下：

表 3 项目绩效目标与绩效指标实际完成情况表

2023 年年度目标			2023 年年度目标完成情况	
安装闯红灯违法监测系统 41 处。			已完成 41 处闯红灯违法监测系统安装工程。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	安装闯红灯违法监测系统数量	≥41 处	41 处
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%
		资金支付合规率	=100%	100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%
	成本指标	项目成本控制率	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	减少道路交通安全隐患	有效减少	99.33%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99.33%

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值 15 分，评价得分 14 分，得分率为 93.33%。



表 4 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重（%）	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	2	2	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	2	1	50%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
小计			15	14	93.33%

1. 项目立项

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

(1) 立项依据充分性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划及相关事业发展政策，项目实施内容与预算单位部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目支出符合公共财政要求和财政供给范围，项目已取得呼图壁县财政局、呼图壁县发展和改革委员会、呼图壁县国有资产监督管理局及呼图壁县交通运输局的批复，立项依据比较充分。

(2) 立项程序规范性



指标分值 2 分，评价得分 2 分。该项目支出预算按照规定的程序申请，项目预算单位编制了项目支出绩效目标表和事前绩效评估报告，项目实施取得有关行政部门的审批且符合相关预算管理要求。

2. 绩效目标

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80%。

（1）绩效目标合理性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。项目预算单位按照自治区、呼图壁县财政部门关于绩效目标管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》，为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标具备合理性。

（2）绩效指标明确性

指标分值 2 分，评价得 1 分。项目预算单位在设定绩效指标时，大部分指标都明确清晰、可衡量，如补助公交车数量等。但仍有少部分指标设置不明确或难以衡量，有待进一步量化，例如：原可持续影响指标为“项目持续发挥作用期限”，预期指标值为“长期有效”，指标设置不明确，本年度难以衡量指标值是否达成。

3. 资金投入

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

（1）预算编制科学性



指标分值 3 分，评价得分 3 分。该项目预算编制经过科学论证，预算支出内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复，预算实际执行未超出预算编制金额。

（2）资金分配合理性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。该项目预算资金分配依据项目可行性研究报告、立项批复以及合同确定，资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

（二）项目管理情况

项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 25 分，评价得分 21 分，得分率为 84.00%。

表 5 项目管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目管理	资金管理	资金到位率	4	4	100%
		年度预算执行率	5	5	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	4	2	50%
		制度执行有效性	4	4	100%
		绩效监控有效性	2	0	0%
		自评报告规范性与整改 反馈及时性	2	2	100%
小计			25	21	84%

1. 资金管理



该指标涉及 3 个三级指标，分值 13 分，评价得分 13 分，得分率为 100%。

(1) 资金到位率

呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程 2023 年度下达资金总额 200 万元，实际到位 200 万元，资金到位率为 100%。指标分值 4 分，根据评分标准该指标评价得分 4 分。

(2) 年度预算执行率

截止 2023 年 12 月 31 日，呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程实际支出资金总额为 200 万元，预算资金执行率为 100%。指标分值 5 分，根据评分标准该指标评价得分 5 分。

(3) 资金使用合规性

指标分值 4 分，评价得分 4 分。通过查看预算单位财务资料，该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的开支范围，资金的拨付拥有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途，财政直接支付凭证金额与审核金额和发票金额一致。

2. 组织实施

该指标涉及 4 个三级指标，分值 12 分，评价得分 8 分，得分率为 66.67%。

(1) 管理制度健全性

指标分值 4 分，评价得分 2 分。预算单位沿用呼图壁县交通运输局的各项内控制度，具有相应的财务和项目管理制度，各项管理



制度合法、合规、完整，但未依据本建设项目的功能特性就规范该项目建设及管理制定专门的内控管理措施。

(2) 制度执行有效性

指标分值 4 分，评价得分 4 分。该项目在项目建设领导小组的统筹协调下，严格执行本单位的各项项目和财务管理制度以及国家相关法律法规。相关人员、设备落实到位，资料齐全并归档及时。

(3) 绩效监控有效性

指标分值 2 分，评价得分 0 分。呼图壁县交通运输局未按要求在项目执行过程中开展绩效运行监控管理工作。

(4) 自评报告规范性与整改反馈及时性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。预算单位按照财政部门及预算资金使用要求，及时开展项目支出绩效自评，绩效自评报告格式规范、内容清晰。

(三) 项目产出情况

项目产出指标从项目实施后的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目实施后的产出情况，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

表 6 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目产出	产出数量	安装闯红灯违法监测系统数量	6	6	100%
	产出质量	工程验收合格率	6	6	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
		资金支付合规率	6	6	100%
	产出时效	资金支付及时率	6	6	100%
	产出成本	项目成本控制率	6	6	100%
小计			30	30	100%

1. 产出数量

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 6 分，评价得分 6 分。根据对项目施工合同、项目支付凭证、验收单等资料进行核对，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目共完成 41 处闯红灯违法监测系统安装工程，完成设定绩效指标。

2. 产出质量

该指标涉及 2 个三级指标，指标分值 12 分，评价得分 12 分。根据对项目采购及施工合同、项目支付凭证、验收单等资料进行核对，该项目已完工工程按照质量要求全部验收合格，验收合格率达到 100%，资金支付合规率达到 100%，完成设定绩效指标。

3. 产出时效

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。根据对项目立项批复、合作协议、项目资金下达文件、财政支付凭证等资料进行核对，该项目资金支付及时率达到 100%，完成设定绩效指标。

4. 产出成本



该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。通过与项目预算申请资料、合作协议、财政资金支付凭证进行核对，该项目资金成本控制率达到 100%，完成设定绩效指标。

（四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益和服务对象满意度两个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

表 7 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目效益	社会效益	减少道路交通安全隐患	20	20	100%
	服务对象满意度	受益群众满意度	10	10	100%
小计			30	30	100%

1. 社会效益

该指标涉及 1 个三级指标，分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目周边受益群众发放并收回调查问卷 30 份。调查问卷中关于“您认为该项目的实施，对减少道路交通安全隐患是否有帮助？”的统计情况，其中，选择“显著减少”的人数为 29 人，选择“有效减少”的人数为 1 人，选择“一般”的人数为 0 人，选择“没有减少”的人数为 0 人，根据计算公式：指标完成率 = Σ 样本数（“显著减少” $\times 1 +$ “有效减少” $\times 0.8 +$ “一般” $\times 0.6 +$ “没有减少” $\times 0.3$ ）/ 总样本数 $\times 100\%$ ，本指标完成率 = $(29 \times 1 + 1 \times 0.8 + 0 \times 0.6 + 0 \times 0.3) / 30 = 99.33\%$ ，大于 95%，完成设定绩效指标。



2. 服务对象满意度

该指标涉及 1 个三级指标，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目周边受益群众发放并收回调查问卷 30 份，调查问卷中关于“您对该项目的实施满意度如何？”的统计情况，其中，选择“非常满意”的人数为 29 人，选择“比较满意”的人数为 1 人，选择“一般”的人数为 0 人，选择“不满意”的人数为 0 人，根据计算公式：指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%，本指标完成率=（29×1+1×0.8+0×0.6+0×0.3）/30=99.33%，大于 95%，完成设定绩效指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 合理规划，全面实施。

项目实施单位根据项目实施方向、内容和要求，结合绩效目标，开展科学合理的规划设计，并按规划设计全面推进实施，并严格控制项目质量。

2. 强化监督，健全工作机制，确保建设质量。

项目实施单位为加强项目建设的质量管理，提高项目成效，规范资金使用，形成激励机制，为了保障战略目标的顺利实现，组成了项目建设的督查组，开展“事前、事中、事后”工作督促指导，确保了项目建设的规范、有序、稳步、快速地推进。



（二）存在的问题

1. 部分项目绩效指标设置不清晰。

该项目实施单位前期已根据项目内容设置了较明确的绩效目标，绩效目标的设置符合量化的要求，但仍有少部分指标偏定性或难以衡量，有待进一步量化，例如：原可持续影响指标为“补贴资金持续发挥作用期限”，预期指标值为“长期有效”，指标设置不明确，本年度难以衡量指标值是否达成。

2. 项目管理制度不健全。

该项目实施单位沿用本单位的各项内控制度，具有相应的财务和项目管理制度，各项管理制度合法、合规、完整，但未依据本建设项目的功能特性就规范该项目建设及管理制定专门的内控管理措施。

3. 未执行项目绩效监控工作。

呼图壁县交通运输局未按要求在项目执行过程中开展绩效运行监控管理工作。

六、有关建议

1. 根据工作计划和工作内容，进一步完善绩效目标和指标。

绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，应与其项目的实施计划相一致，建议项目实施单位在今后细化绩效目标的过程中，应根据项目的实施内容设置项目的产出目标和效果目



标，使目标值与年度任务数或计划数相对应。同时根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰、量化、可衡量。

2. 进一步建立健全预算绩效业务管理制度，强化资金过程监督和现场核查。

建议项目实施单位建立健全预算绩效管理制度，完善项目的跟踪管理机制，进一步强化资金过程监督，在自治区绩效监控、绩效自评的时间节点开展数据采集、核对、校验和复核工作，确保上报数据准确，同时要对项目资金执行情况进行定期的现场核查。通过定期检查，及时掌握资金执行金额、实施效果，为预算调整、管理优化、政策调整等提供决策依据。

3. 加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。

建议项目实施单位将绩效管理培训与业务培训相融合，不断提高职工的预算约束及资金使用效益意识，强化各业务流程贯彻绩效管理的执行力，全面优化绩效管理环境，从而确保单位绩效管理水平能够得到充分的提高。

4. 强化绩效目标管理，提升绩效管理水平。

通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标应当充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。建议项目实施单位在设置绩效指标时可根据相关政策文件要求，设置的指标需指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。



七、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1. 呼图壁县交通运输局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在财政部门 and 预算单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 评价机构与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。



附件：

1. 项目绩效评价指标体系评分表
2. 2023 年项目资金支付明细表
3. 问卷调查分析报告
4. 相关负责人访谈报告
5. 现场勘查照片

新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所

2024 年 7 月 16 日



附件1:

呼图壁县2023年公路生命安全安全防护工程绩效评价指标体系评分表

评价指标					指标解释	评分标准	得分	得分率	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	3	100.00%	
				立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策(0.5分)。	2	100.00%	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平(0.5分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	3	100.00%	
				绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	1	50.00%	部分指标定性或难以衡量
		资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5分)。	3	100.00%	
				资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分(1分); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1分)	2	100.00%	

呼图壁县2023年公路生命安全防护工程绩效评价指标体系评分表

评价指标					指标解释	评分标准	得分	得分率	扣分原因	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称						权重（%）
项目管理	25	资金管理	13	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ①资金到位率为100%，得满分；②资金到位率在80%-100%之间的，每降低1%扣除对应分值5%的权重分；③资金到位率低于80%，得0分。	4	100.00%		
				年度预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	100.00%		
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	4	100.00%		
		组织实施	12	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	2	50.00%	未依据本建设项目的功能特性就规范本项目建设制定专门的内控管理措施	
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）	4	100.00%		
				绩效监控有效性	2	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理，是否根据绩效监控结果采取了调整和改进措施。 ①是否定期对项目实施绩效运行监控管理（0.5分）； ②是否定期归集相关监控数据、资料（0.5分）； ③是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施（1分）。	0	0.00%	未按要求在项目执行过程中开展绩效运行监控管理工作	
		自评报告规范性与整改反馈及时性	2	是否按财政部门要求开展项目支出绩效自评并针对报告中存在的问题进行整改反馈。 ①是否及时开展了绩效自评（1分）； ②绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全（0.5分）； ③针对存在的问题及时进行了整改反馈（0.5分）。	2	100.00%				

呼图壁县2023年公路生命安全防护工程绩效评价指标体系评分表

评价指标							指标解释	评分标准	得分	得分率	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）						
项目产出	30	产出数量	30	安装闯红灯违法监测系统数量	6	项目实际产出数量是否达到预期设定绩效指标。	产出数量指标完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 评分标准： ①完成率为100%及以上的，得满分；②完成率在60%-100%之间的，每降低1%扣除对应分值的权重分；③完成率低于60%的，得0分。	6	100.00%		
		产出质量		工程验收合格率	6	项目已完工工程按照质量要求全部验收合格	指标完成率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%。 评分标准： ①完成率为100%及以上的，得满分；②完成率在60%-100%之间的，每降低1%扣除对应分值的权重分；③完成率低于60%的，得0分。	6	100.00%		
				资金支付合规率	6	项目资金的支付是否合规	指标完成率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%。 评分标准： ①完成率为100%及以上的，得满分；②完成率在60%-100%之间的，每降低1%扣除对应分值的权重分；③完成率低于60%的，得0分。	6	100.00%		
		产出时效		资金支付及时率	6	项目资金是否按照计划时间及时支付	按照计划时间及时支付的，得满分；未按时支付的，得0分	6	100.00%		
		产出成本		项目成本控制率	6	项目资金是否控制在预定成本范围内	成本控制率=（实际成本/计划完成数量成本）×100%。 评分标准： ①控制率为100%的，得满分；②控制率在60%-100%之间的，每降低1%扣除对应分值的权重分；③控制率低于60%的，得0分。	6	100.00%		
项目效益	30	社会效益	30	减少道路交通安全隐患	20	项目实施后是否能够减少道路交通安全隐患	指标完成率=Σ样本数（“显著帮助”×1+“有效帮助”×0.8+“一般”×0.6+“没有帮助”×0.3）/总样本数×100%，分值95%以上，得满分；低于95%，每下降1%，扣权重3%分值；扣完为止。	20	100.00%		
		满意度		10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%，分值95%以上，得满分；低于95%，每下降1%，扣权重3%分值；扣完为止。	10	100.00%			

附件2:

呼图壁县2023年公路生命安全防护工程资金支付明细表

单位: 元

序号	拨付时间	拨付金额	支付时间	支付金额	拨付单位	支付单位
1	2023/8/29	2,000,000.00	2023/8/29	2,000,000.00	呼图壁县财政局	新疆昌吉市政建设(集团)有限公司
合计		2,000,000.00		2,000,000.00		

附件 3：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程，为客观评价该项目的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价“为顾客服务”原理，引入“减少道路交通安全隐患”、“受益群众满意度”等效益指标，了解群众对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

1. 调研对象

本次调研的受益对象为项目的受益群众。

2. 调研内容

(1) 对呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程实施后的满意度，包括对项目的了解情况、该项目是否能够有效减少道路交通安全隐患等。

(2) 对呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

3. 调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

4. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，以受益群众为对象随机抽取 30 人为样本，发放问卷 30 份。

5. 问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调研在呼图壁县交通运输局的协调配合下，组织安排线下纸质问卷的发放与回收。

6. 问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价小组实际发放问卷 30 份，回收问卷 30 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 30 份，有效回收率 100%，本次调研的整体情况如下：

(1) 您认为该项目的实施，对减少道路交通安全隐患是否有帮助？

选项	反馈数量	占比
显著减少	29	96.67%
有效减少	1	3.33%
一般	0	0%
没有减少	0	0%
合计	30	100%

(2) 您对该项目的实施满意度如何？

选项	反馈数量	占比
非常满意	29	96.67%
比较满意	1	3.33%
一般	0	0%
不满意	0	0%
合计	30	100%

(3) 您对于该项目的实施是否有问题或者建议？

无。

附件 4： 相关负责人访谈报告

呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程访谈报告

一、访谈目的

2023 年呼图壁县交通运输局在各级领导的大力支持下，自 2023 年 1 月开始实施呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程，项目实施过程中，呼图壁县交通运输局不断摸排梳理存在的问题，统筹计划安排，分步骤分阶段进行。项目的实施，能够对解决居民出行困难，改善群众生产生活条件，消除安全隐患，促进当地社会经济发展起到至关重要的作用。项目持续时间为 2023 年 1 月-12 月。

本次绩效评价旨在通过该项目资金的主管单位进行访谈，了解和评估专项资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为提升呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程资金使用的公平性和合理性建言献策。

二、访谈对象

预算主管单位：呼图壁县交通运输局

三、访谈内容

呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程开展情况及必要性、项目资金保障情况、项目开展取得的成效及执行过程中遇到的主要困难

和项目的下一步规划。

四、访谈分析

1. 呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程开展情况及必要性

通过线上访谈了解到，“十四五”时期处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，迈入高质量发展新阶段，人、车、路等道路交通要素仍将持续快速增长。预计到 2025 年，我国机动车保有量、驾驶人数量、公路通车里程将超过 4.6 亿辆、5.5 亿人和 550 万公里。同时，交通要素增长重心由大城市向中小城市、城镇转移，乡村振兴、城乡一体化带来的农村交通出行变化，老龄化社会引发的老年人安全出行问题，车路协同、自动驾驶、共享出行等新技术新业态的快速涌现带来的交通流量、出行方式变化，人民群众对美好交通出行的向往和追求等，都对道路交通安全工作提出更高要求。

我国制度优势显著，经济长期向好，社会大局稳定，道路交通安全多部门协同共治的格局基本形成，人民群众的交通安全意识正在逐步提升，新技术新发展不断赋能交通管理领域，为道路交通安全治理工作提供了多方面优势和条件。但必须清醒认识到，我国道路交通安全整体形势依然不容乐观，道路交通安全工作基础仍然比较薄弱，存在不少短板弱项，地区和领域发展不平衡不充分问题仍然突出，农村交通安全问题凸显。公众交通安全意识有待进一步提升，交通违法行为仍较为普遍，货车和低速电动车等违法违规生产改装问题依然存在，道路通行条件总体不平衡，交通安全设施设置水平有待提升，道路交

通相关行业企业安全主体责任落实不到位问题依然突出，企业重效益轻安全问题长期存在。涉及交通安全的一些深层次、根源性问题尚未化解，道路交通安全法律法规体系有待进一步完善，新变化、新业态带来的新风险不断涌现，传统问题和新型矛盾交织叠加，道路交通安全工作面临诸多新形势、新任务、新挑战。总体来说，“十四五”期间我国道路交通安全工作仍将处于爬坡过坎、突破瓶颈的关键时期。

呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程主要针对 G312 国道沿线缺少红绿灯和安全标志标牌的现状进行提升改造。G312 线是呼图壁县地理交通的核心地带，车流量较大，过境车辆较多，车辆违法超速情况严重，存在一定的交通安全事故隐患，发生过重特大交通事故案件。为全面治理 G312 线交通安全隐患，降低交通安全事故，呼图壁县交通运输局计划实施呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程，项目的实施对解决居民出行困难，改善群众生产生活条件，消除安全隐患，促进当地社会经济发展起到至关重要作用。

2. 项目资金保障情况

该专项预算每年编制一次。预算年度自每年 1 月 1 日起，至 12 月 31 日止。预算单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，是独立核算单位，财务办公室负责预算的组织和实施。主要职责是组织实施已经由呼图壁县财政局审议、批准的年度预算；对预算执行过程实行全方位的控制、监督工作；定期向单位领导汇报预算的执行情况。该专项预算是根据单位各项工作发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为

确保项目顺利实施的基本支出。

3. 项目开展取得的成效

该项目于 2023 年 1 月开始实施，截止 2023 年 12 月 31 日，已完成 41 处闯红灯违法监测系统的安装工程。项目的实施，能够对解决居民出行困难，改善群众生产生活条件，消除安全隐患，促进当地社会经济发展起到至关重要的作用。

4. 项目执行过程中遇到的主要困难

一是本单位职工对绩效管理参与度不够，对绩效考核分析不到位，绩效指标分析人员业务素质有待提高，思想认识还需进一步深化。二是对绩效工作认识不到位，绩效工作重视力度不够。


5. 项目的下一步规划。

一是加强绩效工作业务培训，不断提高业务水平。二是提高重视度，加强与单位领导的沟通联系，增加人员，并派专人学习培训，做好绩效评价工作。三是加大对资金的监控力度，每笔资金的走向都要清楚，合理使用每笔资金，细化资金的收支。


附件 5：现场勘查照片



图片 1：现场勘查照片（1）

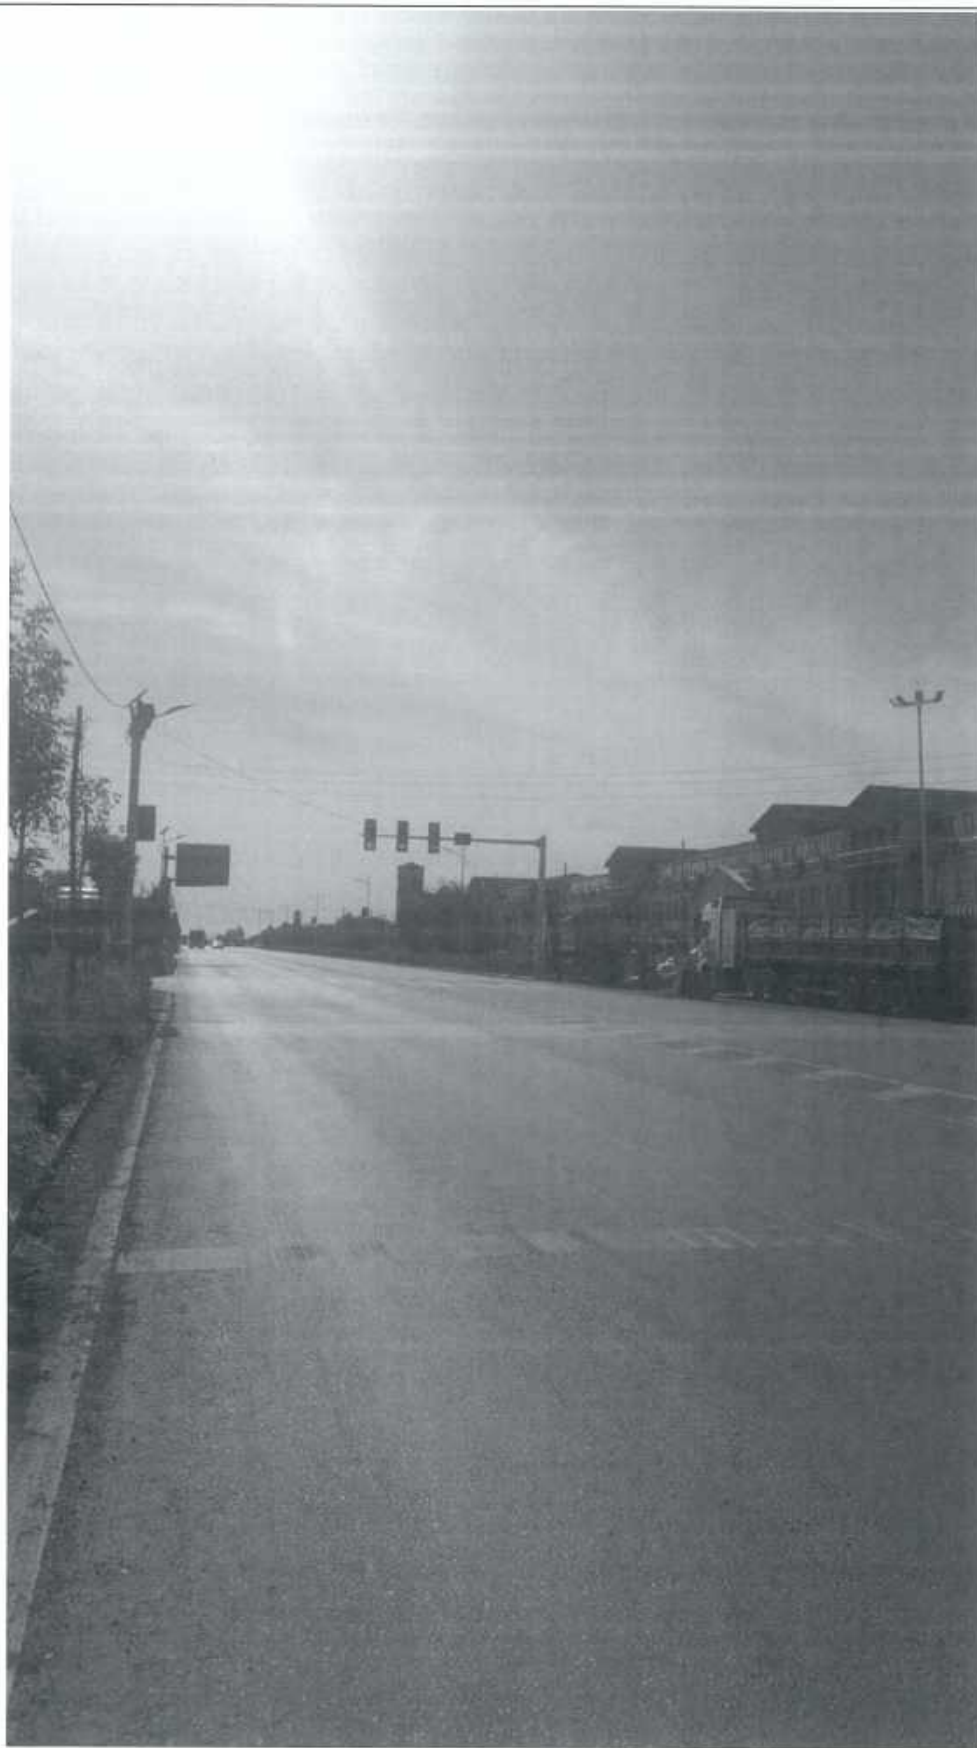

图片 2：现场勘查照片（2）

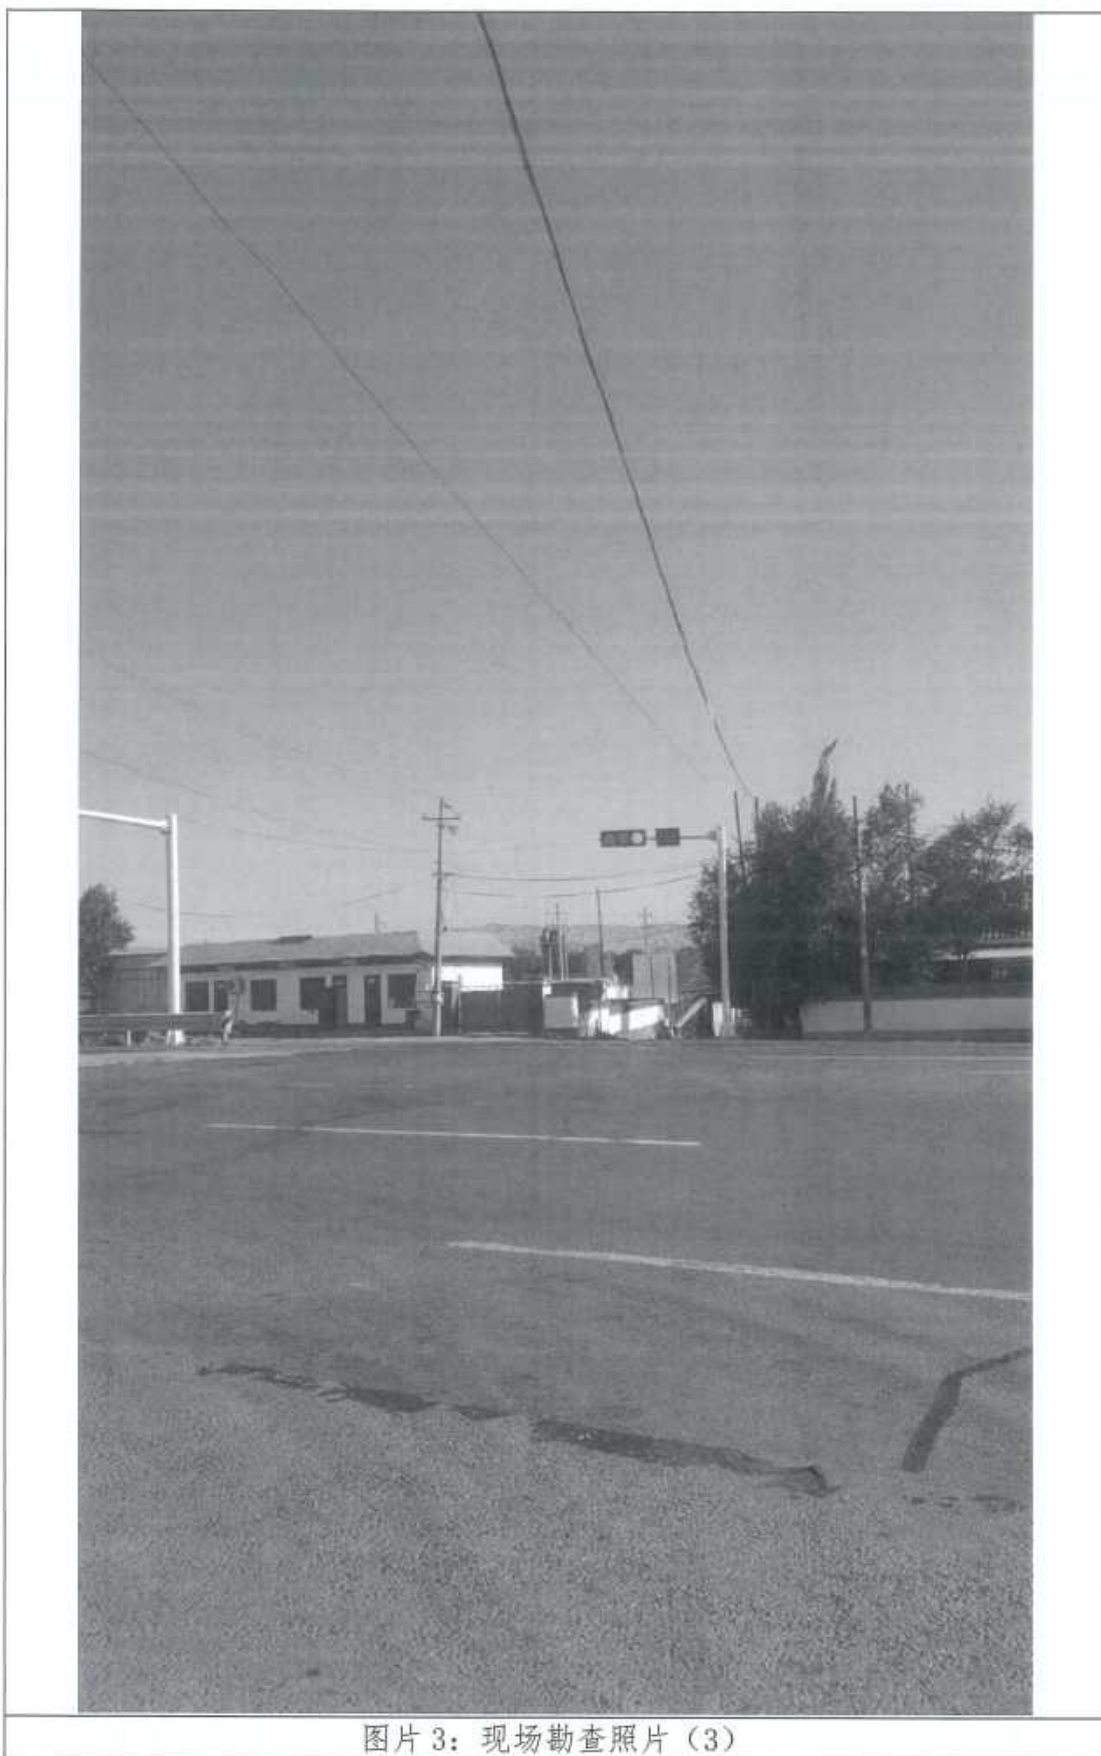

图片 3：现场勘查照片（3）



图片 4：现场勘查照片（4）



图片 5：现场勘查照片（5）
